MONTERING SVILLE KASSE HVAL STASJON

Oppdragsbeskrivelse

Hval

KM: Ca. km 85,260 (Roa - Hønefoss linjen, Testline ERTMS)

Tekstlig beskrivelse:

Det skal installeres og erstattes eksisterende sville med svillekasse iht. Vedlegg 1 – Arbeidstegning Svillekasse Hval.


Det skal legges et fleksibelt rør som skal føres vinkelrett ut fra spor til det er utenfor kabelfritt profil (2,5m fra spormidt). Det fleksible røret skal være gjennomgående i svillekassen. På venstre side retning Oslo skal det fleksible røret tilknyttes eksisterende føringsvei. På høyre side retning Oslo skal røret tilknyttes kum for akselteller. Svillekassen skal jordes. Montering må gjennomføres iht. Vedlegg 3 – Installation and Maintenance Manual.


Utførende

Arbeidet utføres av NRC Group As avd Bane

Arbeidslag består av 1 banemontør/hsv, 1 kl montør, 1 grunnarbeider og 1 maskinfører. Maskin brukt er gravemaskin type Liebherr 914

Skisse og tegning

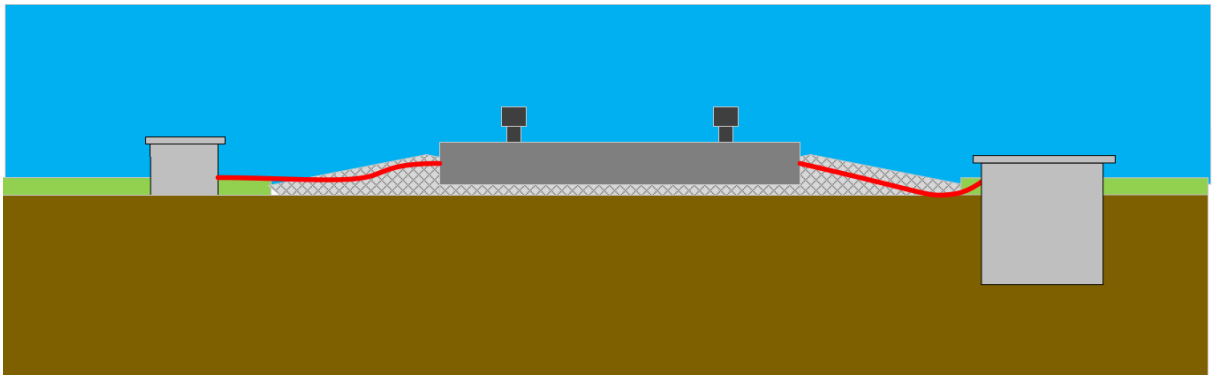

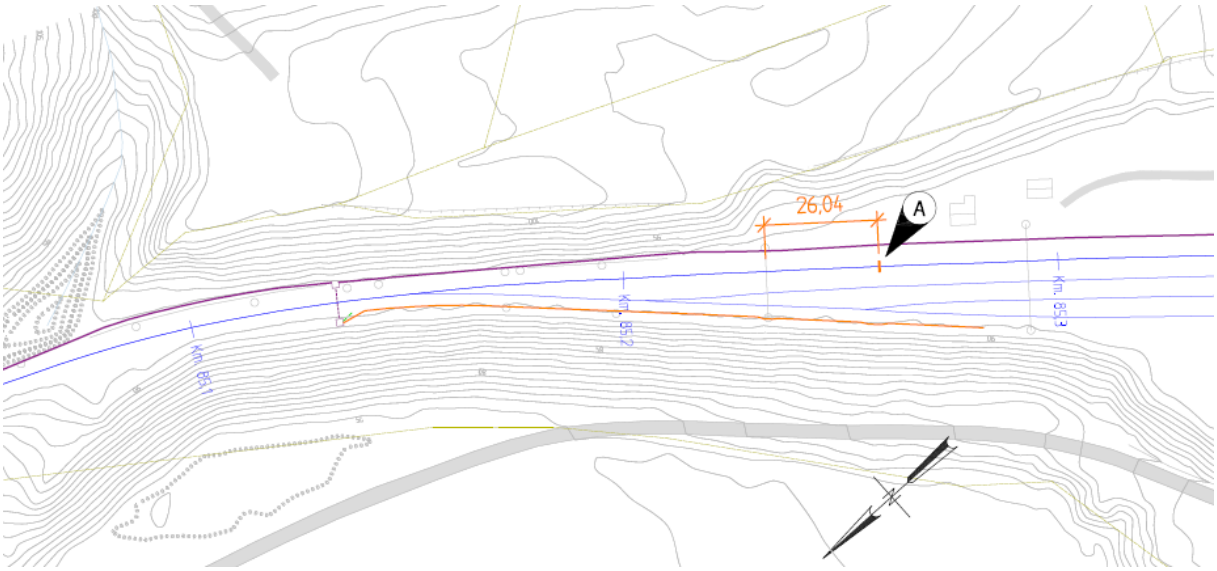

Utførelse

NRC startet arbeid kl 0700 den 25.11 2020 (sville kasse er kjørt ut på forhand, og maskin er flyttet fra Jevnaker på tirsdags kveld.) Sville som skal byttes er forhandsmerket av arbeidsleder NRC. Banemontør kontrollerer skinne temperatur, 0730 begynner arbeidet med fjerning av betongsville. Etter fjerning av betongsville fjernes også et lag masser under sville, dette laget erstattes av ny balastpukk som komprimeres før kassesville monteres. 2x50mm trekkerør legges fra eksisterende kanal gjennom sville kasse og inn i kum motsatt side. Jording etableres og ny balast pukk fylles rundt kasse sville og pakkes med handpakker. Alt arbeid med bytte av sville, trekking av rør, jording, pakking og opprydding tar ca 3,5 timer.

Ingen problemer eller utfordringer i forhold til utførelse av arbeid.

Bilder

