KONTROLL AV ISOLERTE SKINNESKJØTER

Kontroll av isolerte skjøter ved sugetransformatorer foretas med et ohm - meter. For å forhindre at målingene blir påvirket av fremmede strømmer må sporet kortsluttes som vist på skisse.


Kortslutt sporet med kontaktmagneter, en på hver side av skjøten og en over skjøten.

Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.

Mål med ohm - meter mellom skinne og lask

Minste tillatte motstandsverdi:

- 100 K 0 ved innlegging
- 10 K 0 ved senere kontroller

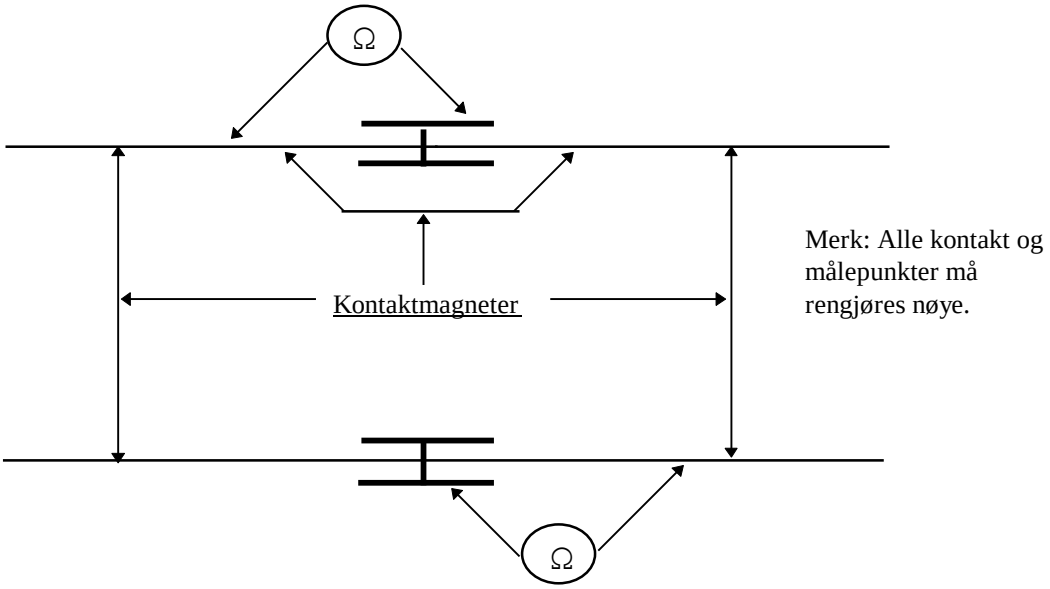

Skjøt v/ km			
Trafo nr.	Type skjøt	R - ohm	Merknader
Høyre			
Venstre			
Høyre			
Venstre			

Skjøt v/ km			
Trafo nr.	Type skjøt	R - ohm	Merknader
Høyre			
Venstre			
Høyre			
Venstre			

Skjøt v/ km			
Trafo nr.	Type skjøt	R - ohm	Merknader
Høyre			
Venstre			
Høyre			
Venstre			

Skjøt v/ km			
Trafo nr.	Type skjøt	R - ohm	Merknader
Høyre			
Venstre			
Høyre			
Venstre			

Skjøt v/ km			
Trafo nr.	Type skjøt	R - ohm	Merknader
Høyre			
Venstre			
Høyre			
Venstre			
