1 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK STRØMLEVERING 2
2 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK C-STRØM 3
3 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK BKC-REGULATOR 4
4 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK, PLUSS- OG MINUSSTRØM 5
5 KONTROLLISTE SIDESPOR 6

1 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK STRØMLEVERING

Ledning koples til pkt.2-4 og 7-10 for å få riktig strøm til BK+ og BK-.

Strømlevering for linjeblokk

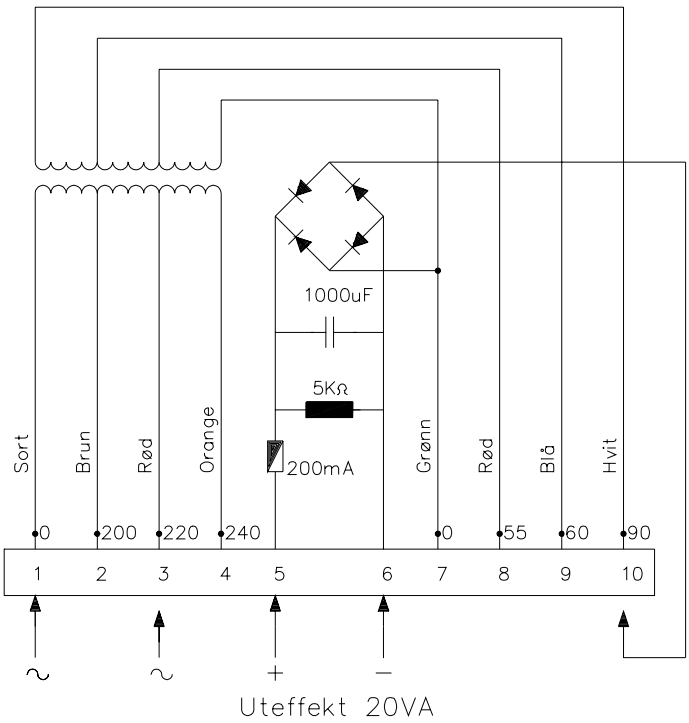

Uteffekt 20VA

Dioder BK

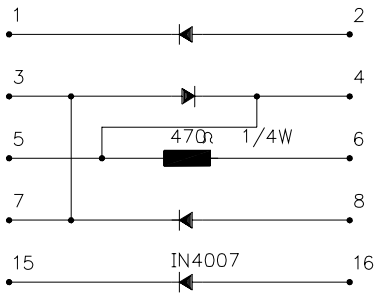

2 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK C-STRØM

Kople ledning fra S60/II til linjetransformator pkt.6 på avg.st.

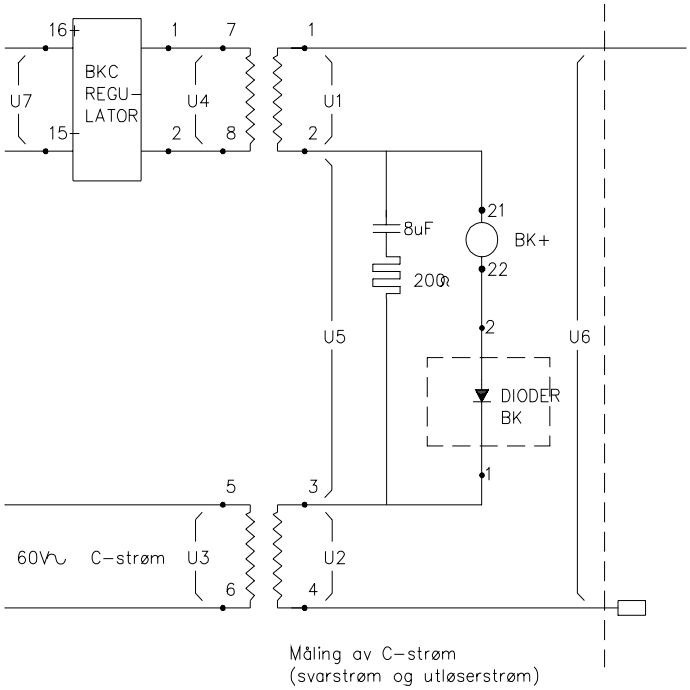

Måling av C-strøm
(svarstrøm og utløserstrøm)

	Stasjon M		Stasjon L	
V – mA	Avg.st.	Ank.st.	Avg.st.	Ank.st.
U1 (V)				
U2 (V)				
U3 (V)				
U4 (V)				
U5 (V)				
U6 (V)				
U7 (V)				
I (mA)				

3 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK BKC-REGULATOR

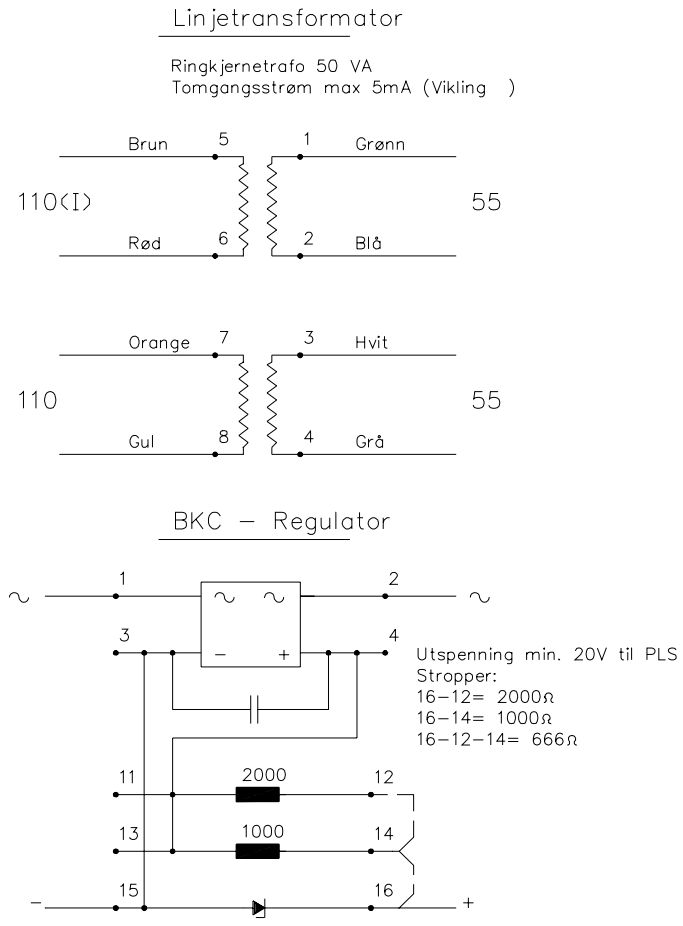

Inng.sp. til PLS	Stasjon M		Stasjon L	
	Avg. st.	Ank. st.	Avg. st.	Ank. st.
Volt				

	Stasjon M	Stasjon L
Ω		

4 MÅLESKJEMA LINJEBLOKK, PLUSS- OG MINUSSTRØM

Måling av plusstrøm.
(Anmoder – og svarstrøm)

V – ma	BKM+	BKL+
U1 (V)		
U2 (V)		
U3 (V)		
I (mA)		

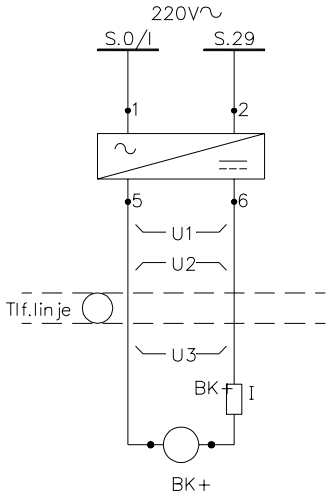

Måling av minusstrøm.
(utløserstrøm)

V – ma	BKM–	BKL–
U1 (V)		
U2 (V)		
U3 (V)		
I (mA)		
I v/KTP (mA)		

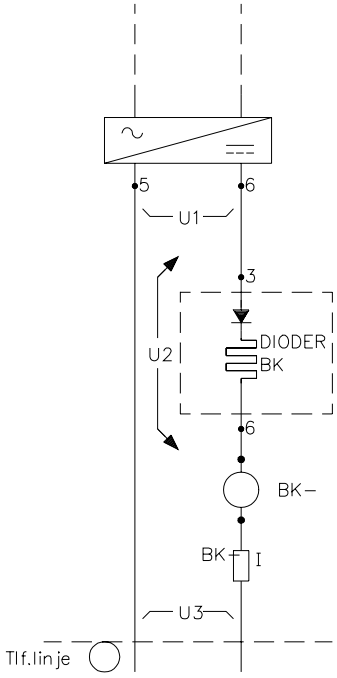

5 KONTROLLISTE SIDESPOR

Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
……..	……..	……..	……..	……..
Sign.	Sign.	Sign.	Sign.	Sign.
……..	……..	……..	……..	……..

1. Alle spenninger på hovedtransformator kontrollert v/normal tilførselspenning og med belastning

Målt	Prim:	(220V~)
	Sek:	(220V~)
Oversp.vern		(300V)

Målt	Målt	Målt	Målt	Målt

2. Likerettere kontrollert for riktig polaritet, spenning og kondensator

Målt	Prim:	(220V~)
	Sek:	(36V=)
Kondensator		(2200uF)
	Sek:	(24V=)
Kondensator		(2200uF)

Målt	Målt	Målt	Målt	Målt

3. Vekselretter kontrollert med belastning. Batteri kontrollert for riktig polaritet og spenning.

Målt	Prim:
	Sek:
Batteri	+ til - :
Batteridrift	Sek:

Målt	Målt	Målt	Målt	Målt

4. Batterilader for Tlf. kontrollert for riktig polaritet og spenning.

Målt	Sek:	(2,4V=)

Målt	Målt	Målt	Målt	Målt

5. Overspenningsbeskyttelse for modem kontrollert.

Målt	Overslagsspenning
Fase-Fase	
Fase-jord	
Fase-jord	

Målt	Målt	Målt	Målt	Målt
