#794857 FORBEDRINGSFORSLAG REGISTRERT

Bane NOR må vurdere å slutte å bygge plattform på bruer.



Vedlegg

5

onsdag 3. desember 2025 10:00 | Tildelt **Bane NOR - Etterlevelse og Sikkerhet - Sikkerhet, miljø og kvalitet (SMK) - SMK Drift og vedlikehold - SMK Drift og vedlikehold - Sikkerhetsstyring, Cordt-Hansen, Susanne (corsus)** |

Innmelder skriver:

Plattform på bruer. Dette er unødvendig barriere ved evakuering. Slik de er konstruert kan det være mulig for passasjerer å evakuere ut på plattformen, men det er vel 90 cm videre ned i pukken. Det er ingen trapper i endene av plattformene. I tillegg vil plattformene fungere som en stor barriere ved evakuering fra andre siden av broen. Ved evakuering ut fra Ulriken tunnel i Bergen vil plattformen (se vedlagt bilder) hindre de evakuerte i å passere plattformen hvis det blir stående vogner til plattformene.

Plattformene vil også øke risikoen for fastkjøring og avsporing av tog ved at sporene mellom plattformene fort fylles med snø. Denne konstruksjonen vil være farlig å benytte i snørike områder, der er vi avhengig av at snøen blåser vekk.

Jeg ber derfor om at Bane NOR slutter å bygge broer med plattform og sørger for at det blir bygget trapp i hver ende av plattformen på broer som er i drift.

Jeg har bladd litt rundt i målevognsbilder der jeg tror det har vært bygget bruer de seinere år, og funnet at lignende konstruksjoner er brukt på flere strekninger, men på Farriseidet – Porsgrunn har de valgt en helt annen løsning i 2018 på målevognsbilde (vedlagt). Så det går an å få dette til hvis det bare er vilje til stede…

Innrapportert av (person)
Sandhåland, Malvin (975044, xsama@banenor.no)

Følgende informeres om saken
Dæmring, Tony (968782, td@banenor.no), Rugtvedt, Lars (906757, RUGTLA@banenor.no), Skauge, Bjørn (962692, bjs@banenor.no)

Rapportert av enhet
Vestlandet


Opplysninger fra
Elektronisk innmelding

TILTAK

Ingen tiltak har blitt lagt til

VEDLEGG

FILER

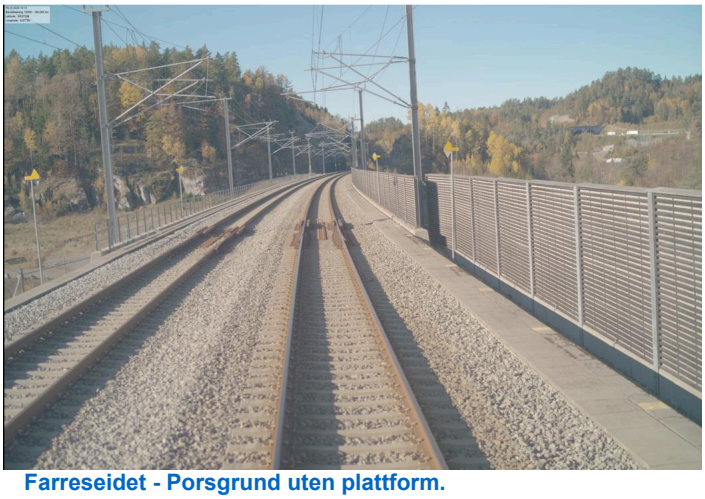

Farreseidet - Porsgrund uten plattform.
Sandhåland, Malvin (xsama)
mandag 8. desember 2025, 07:20
1.65 MB



Nordlandsbanen
Sandhåland, Malvin (xsama)
mandag 8. desember 2025, 07:20
2.53 MB



Vestfoldbanen kobbervikdalen
Sandhåland, Malvin (xsama)
mandag 8. desember 2025, 07:20
1.27 MB



Ulriken tunnel fra vest
Sandhåland, Malvin (xsama)
mandag 8. desember 2025, 07:20
1.62 MB



Ulriken tunnel fra øst
Sandhåland, Malvin (xsama)
mandag 8. desember 2025, 07:20
1.56 MB

gen linker er vedlagt

KOMMENTARER

Ingen kommentarer har blitt lagt til
